

ID	Regim účelů	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	1.VIII.22	8.VIII.22	15.VIII.22	22.VIII.22	29.VIII.22	5.IX.22	12.IX.22
1	✈	Rekonstrukce obecního domu Havaj	81 dny	1.8.22	28.11.22							
2	✈	SO 01.01 Zateplení obvodového pláště	75 dny	1.8.22	18.11.22							
3	✈	Zemní práce	7 dny	10.8.22	18.8.22							
4	✈	Zakladání	10 dny	19.8.22	5.9.22							
5	✈	Buracní práce	5 dny	3.8.22	9.8.22							
6	✈	Úpravy povrchov	40 dny	10.8.22	7.10.22							
7	✈	Isolace proti vodě	5 dny	6.9.22	12.9.22							
8	✈	Komunikace	2 dny	7.11.22	8.11.22							
9	✈	SO 01.02 Zateplení střešního pláště	49 dny	15.8.22	25.10.22							
10	✈	Buracní práce	10 dny	15.8.22	26.8.22							
11	✈	Isolace tepelne	15 dny	29.9.22	19.10.22							
12	✈	Isolace střeš pov.krytiny	2 dny	20.10.22	21.10.22							
13	✈	Konstrukce tesárske	20 dny	30.8.22	28.9.22							
14	✈	Konstrukce - dřevostavby	19 dny	29.9.22	25.10.22							
15	✈	Konstrukce klaparske	10 dny	29.9.22	12.10.22							
16	✈	Konstrukce krytiny tvrdé	2 dny	13.10.22	14.10.22							
17	✈	nátery	4 dny	29.9.22	4.10.22							
18	✈	SO 01.03 Výměna exteriérových oken a dveří	59 dny	1.9.22	28.11.22							
19	✈	Buracní práce	15 dny	1.9.22	16.9.22							
20	✈	Konstrukce stolárske	30 dny	23.9.22	4.11.22							
21	✈	Úpravy povrchov	10 dny	7.11.22	21.11.22							
22	✈	Konstrukce zvislé	6 dny	7.11.22	14.11.22							
23	✈	Konstrukce klaparské	4 dny	22.11.22	25.11.22							
24	✈	Malby	5 dny	22.11.22	28.11.22							
25	✈	SO 01.04 Ostatní stavební práce	48 dny	5.8.22	14.10.22							
26	✈	Ostatné konstrukcie a práce buracie	20 dny	10.8.22	8.9.22							
27	✈	Úpravy povrchov	10 dny	9.9.22	23.9.22							
28	✈	Konstrukcie tesárske	15 dny	29.8.22	20.9.22							
29	✈	Isolácie proti vlhkosti	5 dny	5.8.22	11.8.22							
30	✈	Isolácie tepelne	3 dny	12.8.22	16.8.22							
31	✈	Konstrukcie - dřevostavby	3 dny	10.10.22	12.10.22							
32	✈	Nátery	10 dny	26.9.22	7.10.22							
33	✈	Malby	5 dny	10.10.22	14.10.22							
34	✈	SO 01.04.1 Vzduchotechnika	20 dny	3.10.22	28.10.22							
35	✈	Zemné práce	20 dny	3.10.22	28.10.22							
36	✈	SO01.04.2 Ústřední kúrenie	25 dny	19.9.22	21.10.22							
37	✈	Ostatné stavebné práce	3 dny	19.9.22	21.9.22							
38	✈	Ústředné kúrenie,rozvodné potrubie	5 dny	22.9.22	28.9.22							
39	✈	Ústředné kúrenie,vykurovacie telasa	3 dny	29.9.22	3.10.22							
40	✈	Ústředné kúrenie,armatury	5 dny	4.10.22	10.10.22							
41	✈	Ústředné kúrenie,kotolne strojomre	8 dny	11.10.22	20.10.22							
42	✈	Isolácie tepelne	1 den	21.10.22	21.10.22							
43	✈	SO 01.04.3. Elektroinštalacia	29 dny	17.10.22	28.11.22							
44	✈	Ostatné stavebné práce	5 dny	17.10.22	21.10.22							
45	✈	Elektromontaže	24 dny	24.10.22	28.11.22							
46	✈	Dokončovacie práce	5 dny	24.10.22	28.10.22							
47	✈	Drobne stavebné práce	5 dny	24.10.22	28.10.22							
48	✈											

Projekt: Harmonogram Havaj 0  
Datum: 27.6.22

Ukol: Rozdělení, Milník, Souhrnný

Souhrnný projekt


Neaktivní ukol, Neaktivní milník, Neaktivní souhrn

Ruční ukol, Pouze s dobou trvání, Ruční ukoly zahrnuté v souhrnném ukolu, Ruční souhrn

Pouze zahájení, Pouze s datem dokončení, Vnější ukoly, Vnější milník

Konečný termín, Problém ručně zadávaného ukolu

Stránka 1

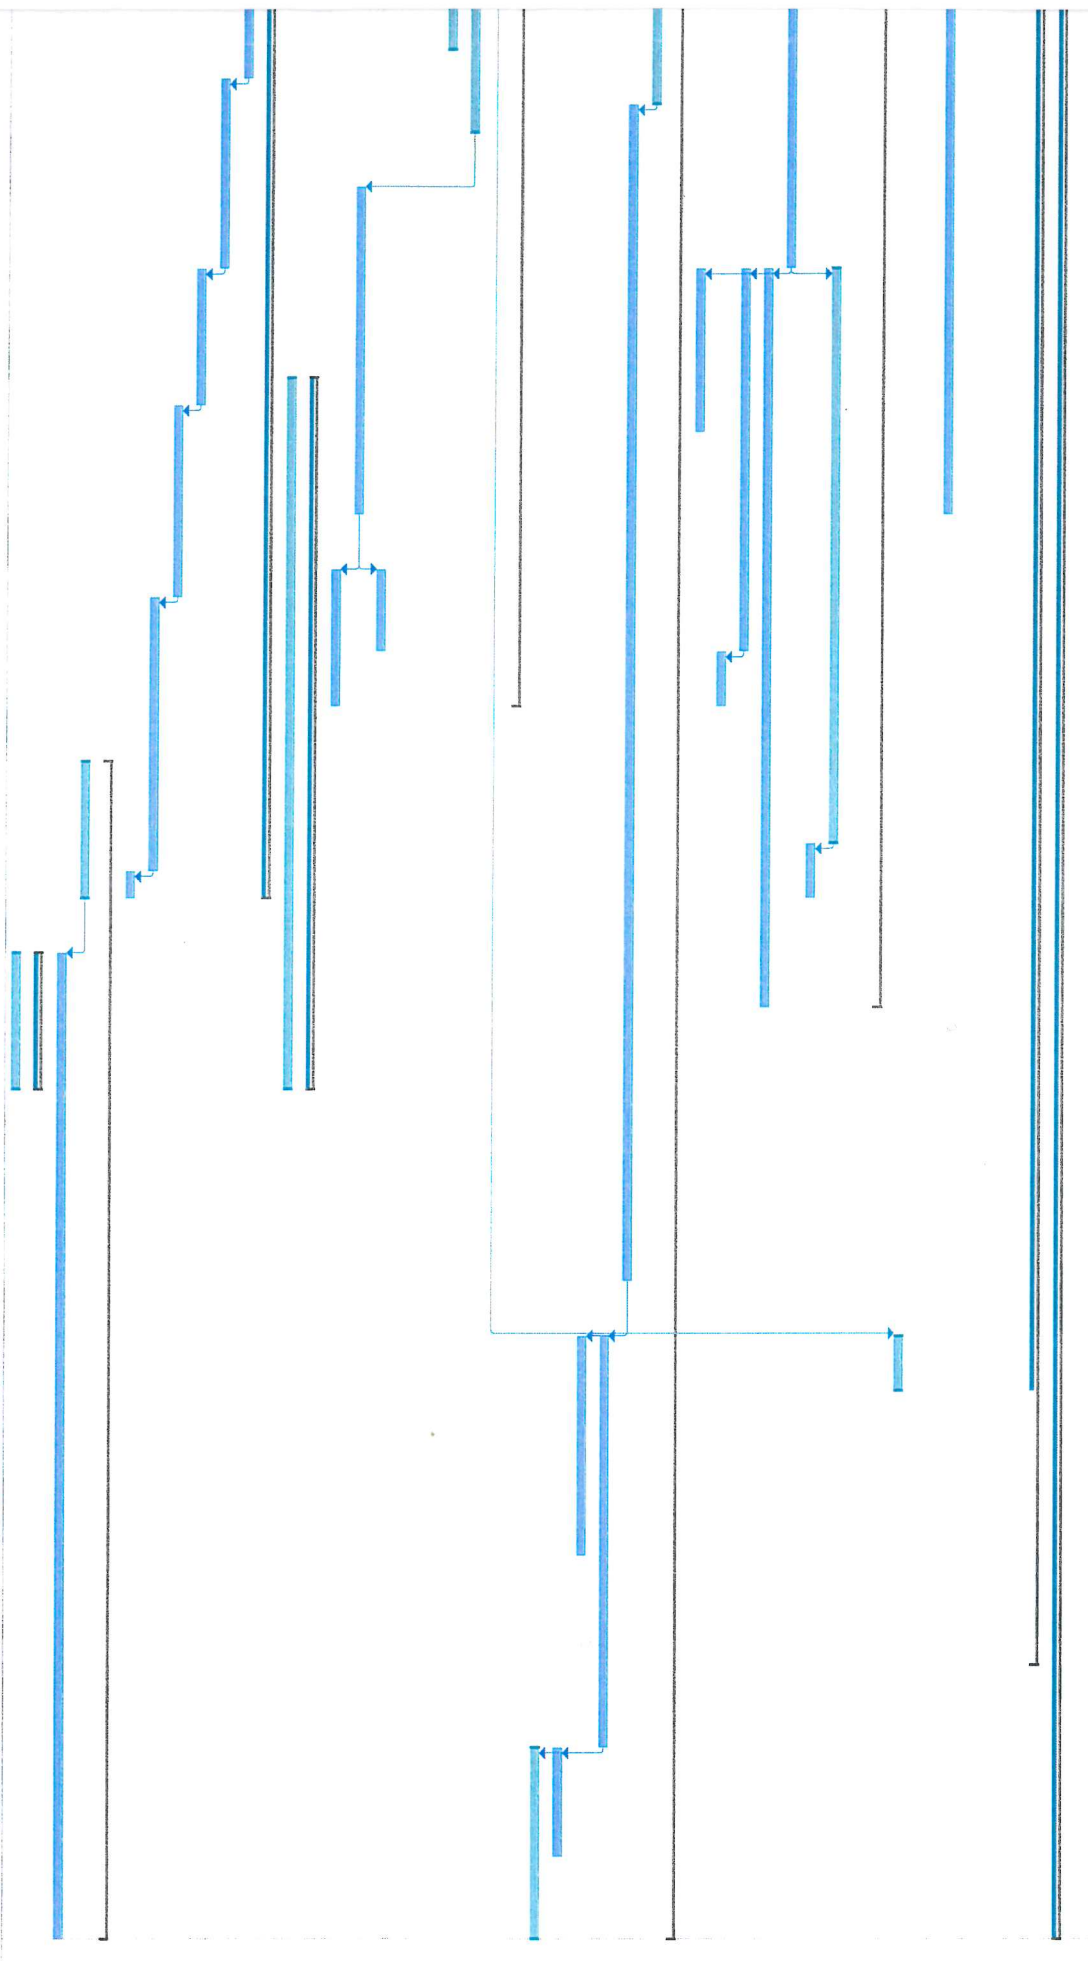

Program Havaj o

<b>Úkol</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Souhrn projektu</li> <li>Rozdělení</li> <li>Milník</li> <li>Souhrny</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neaktivní díl</li> <li>Neaktivní milník</li> <li>Neaktivní souhrn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruční úkol</li> <li>Pouze s dobou trvání</li> <li>Ruční úkoly zahrnuté v souhrnání úkolu</li> <li>Ruční souhrn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pouze zahájení</li> <li>Pouze s datem ukončení</li> <li>Vnější úkol</li> <li>Vnější milník</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konečný termín</li> <li>Průběh</li> <li>Průběh ručně zadávaného úkolu</li> </ul>
-------------	---	---	--	--	---
